



الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية  
International Islamic Charity Organization



هيئة حكومية مستقلة

التقرير الدوري الثالث  
للقرى السكنية

# لمتضرري الفيضانات والزلازل

في

## باكستان

أكتوبر  
2016





التقرير الدوري الثالث  
للقرى السكنية

# لمتضرري الفيضانات والزلازل

في

باكستان

أكتوبر  
2016



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



2

التقرير الدوري الثالث لغرض المساعدة  
 لمتصري الفيضانات والزلازل





بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



Pakistan

3

التقرير السنوي الثالث للقرن السعيد  
للمخبري الفيضيات والزلازل





التقرير الدوري الثالث لقرن التسعينات  
لمتصري الفيضانات والزلازل





سمو ولي العهد  
الشيخ / نواف الأحمد الجابر الصباح  
حفظه الله




حضرة صاحب السمو  
الشيخ / صباح الأحمد الجابر الصباح  
أمير دولة الكويت حفظه الله ورعاه

Pakistan

5

التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء  
امتصيري الفيزيائات والزلازل

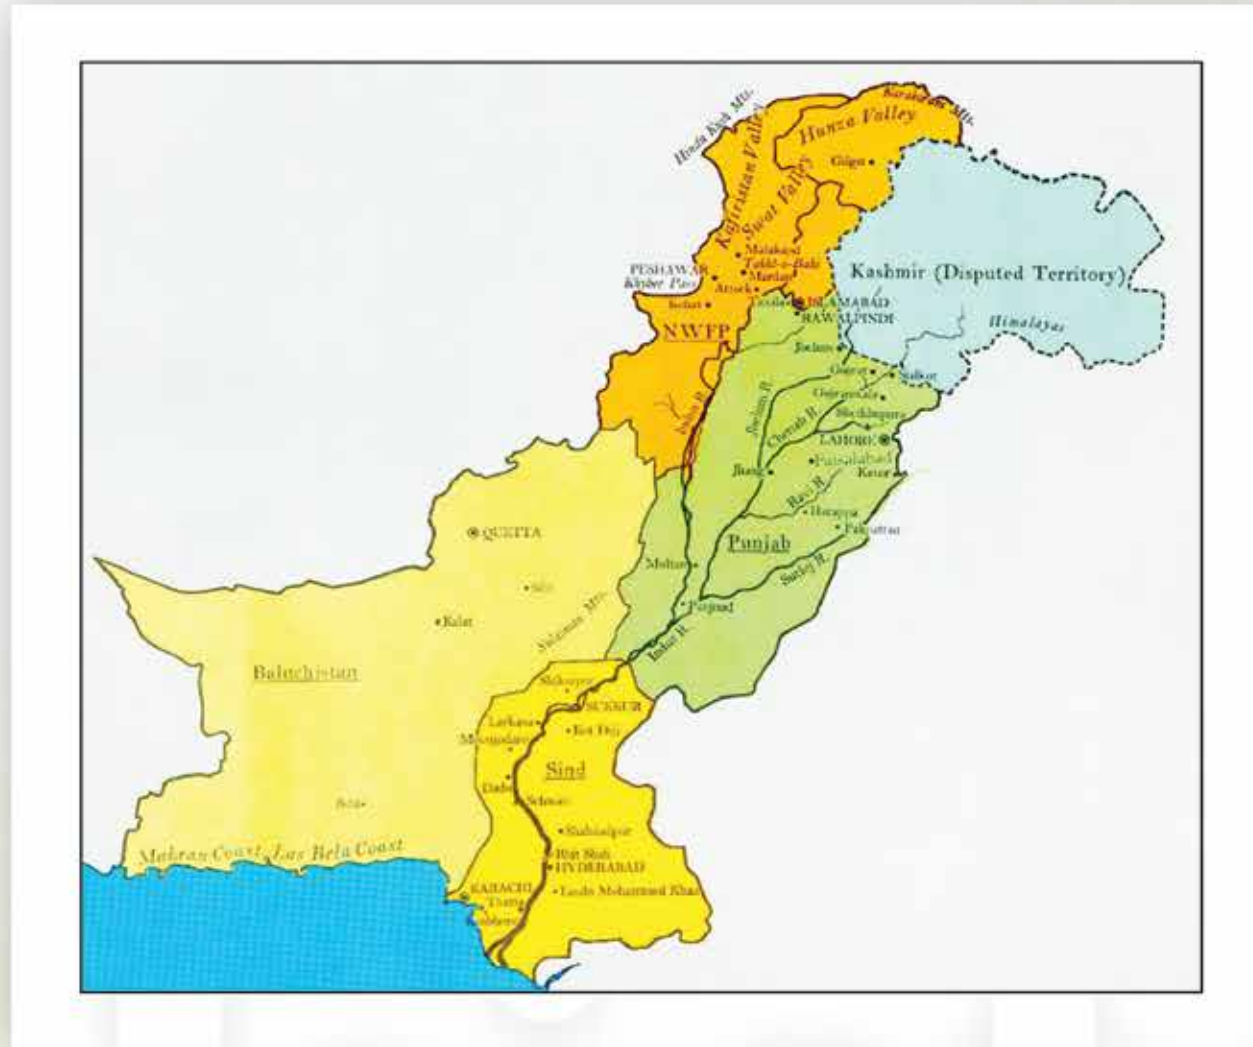




# قرى الخير الخير



د. عبد الله معتوق المعتوق  
رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية  
المستشار في الديوان الأميري  
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة  
للشؤون الإنسانية

منذ وقوع كارثة الفيضانات والزلازل التي ضربت باكستان ونتج عنها تشريد الآلاف من الأسر نتيجة الدمار الكبير الذي حدث جراء الكارثة، فقد استشرعنا في الهيئة كبر حجم المأساة وما نتج عنها من أضرار، فكانت البداية في إرسال عدة وفود من الهيئة لمعاينة الأضرار وتقدير الاحتياجات الضرورية للأسر، وما يمكن أن نقدمه للتخفيف من معاناتهم، فسُيرت الهيئة القوافل الإغاثية والطبية العاجلة للأقاليم المتضررة، والتي كانت تحتاج بجانب المساعدة إلى إعادة بناء ما دُمر، فقد تم اعتماد بناء ثلاث قرى بتبرع كريم من بيت الزكاة، وبإشراف الهيئة الخيرية، فيسرنى أن أضع بين أيديكم هذا التقرير التفصيلي عما ما تم إنجازه من مراحل العمل داخل القرى.



Pakistan

7

التقرير السنوي الثالث للقرى السكنية  
لمتضرري الفيضانات والزلازل

## مقدمة

منذ بداية كارثة الفيضانات في 2010 وبتوجيهات سامية من حضرة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه وعملاً على توحيد الجهود لإغاثة أشقائنا في باكستان وتلبية لهذه التوجيهات قامت إدارة الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية بإيفاد الوفود تلو الوفود لتنفيذ البرامج الإغاثية في جميع أقاليم باكستان، حيث قدمت الهيئة العديد منها لآلاف الأسر المتضررة جراء الفيضانات والزلازل، كما قدمت العديد من القوافل الطبية والمشاريع التنموية، ومن هذه البرامج تسكين الأسر التي فقدت مسكنها، إذ تم اعتماد بناء ثلاث قرى بتبرع كريم من بيت الزكاة الكويتي، وبشرت الهيئة الخيرية فعلياً في بناء قريتين إحداها في إقليمي كشمير (مظفر آباد) والأخرى في البنجاب (مظفر كره)، وجر الانتهاء من القريتين بمشيئة الله قبل نهاية عام 2016 م، وحسب آخر المستجدات تشير بأن نسب الإنجاز التي تم تنفيذها في القريتين ما يلي:

- قرية إقليم كشمير (مظفر آباد) إلى 93 %.
- قرية إقليم البنجاب (مظفر كره) إلى 61 %.

## الأهداف

- إيواء الأسر المتضررة من آثار الفيضانات.
- التخفيف عن الأسر المتضررة اجتماعياً ومادياً.



التقرير السنوي الثالث لقرى الضفيرة  
لمتضرري الفيضانات والزلازل



# القرية الأولى مظفر آباد - كشمير



9

التقرير الدوري الثالث للقرى المتكيفة  
لمتصري الفيضانات والزلازل



## حجم وطبيعة المشروع :

- القرية النموذجية في مظفر آباد - كشمير .
- مساحة البيت :  $41 \times 22$  قدماً مربعاً .
- يتكون من غرفتين مساحة الغرفة :  $12.5 \times 12.5$  قدم مربع .
- مطبخ بمساحة :  $8 \times 7$  أقدام مربعة .
- حمام بمساحة :  $7 \times 5$  أقدام مربعة .
- حوش غير مسقوف بمساحة :  $18 \times 8$  قدماً مربعاً .
- القرية مقسمة الى خمس وحدات :  $E + D + A + B + C$
- A - 56 بيتاً .
- B - 54 بيتاً .
- C - 52 بيتاً .
- D - 34 بيتاً .
- E - 4 بيوت .

- كل أربعة عشر بيتاً يتم عمل فاصل بشارع مساحتة 3 أمتار في البولك A .

- وقد فرضت الحكومة الباكستانية على المقاول عمل فصل بين كل بيت والبيت الآخر بمساحة قدرها نصف متر .




10

التقرير الدوري الثالث لقرار التنمية  
لمتضرري الفيضانات والزلازل

# تقرير عن تطور بناء 200 بيتا في كشمير (مشروع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية - الكويت)

## CURRENT PROGRESS REPORT OF 200 HOUSES AJK PAKISTAN (IICO KWAIT PROJECT)

Sr. #	Description of Work	Current Progress (Houses)	Unit Cost	% age in one house	% age in 200 houses
1	Excavation of Foundation	200	15,000	2.1	413.8
2	Concrete / DPC	200	56,000	7.7	1544.8
3	Block Work to Plinth Level	193	38,000	5.2	1011.6
4	Pillars Filling 11 Nos. each House	200	33,168	4.6	915.0
5	Block Work Complete (Super Structure)	193	149,635	20.6	3983.4
6	Plaster Work	193	72,500	10.0	1930.0
7	Floor Work (Flooring)	150	60,300	8.3	1247.6
8	Shuttering/Filling of Bath Room Roof/Beam	193	12,605	1.7	335.6
9	Door/Windows/Ventilator Steel Frame	193	25,200	3.5	670.8
10	Doors/Windows/Ventilator	200	32,000	4.4	882.8
11	Doors/Windows/Ventilator fixing	3	2,000	0.3	0.8
12	Roof (CGI Sheet) Fixing Materials	200	87,300	12.0	2408.3
13	Roof (CGI Sheet) Fixing Complete- fixing	193	14,000	1.9	372.7
14	Roof Ceiling Materials	150	30,000	4.1	620.7
15	Roof Ceiling fixing	120	4,000	0.6	66.2
16	Plumbing/Sanitary Material Pruchased	200	17,292	2.4	477.0
17	Plumbing/Sanitary Work Completed	150	3,000	0.4	62.1
18	Electricity Material Pruchased	200	14,000	1.9	386.2
19	Electricity Work completed	140	2,000	0.3	38.6
20	Main Gate material already purchased	150	11,000	1.5	227.6
21	Main Gate & Fixing	70	1,000	0.1	9.7
22	Paint Material purchased	150	15,000	2.1	310.3
23	Paint labour	3	5,000	0.7	2.1
24	Filling (base to Plinth Level)	193	25,000	3.4	665.5
Total of amount of one house			PKR 725,000		18583.1
			Work Completion %age		92.9



*Muhammad Ali*





تركيب المرافق والتجهيزات للبيوت





شارع داخل القرية يحوي عدة بيوت



13

التقرير السنوي الثالث لقرى المتضرري الفيضانات والزلازل





مجموعة من البيوت داخل القرية



Pakistan

التعمير الدوري الثالث لقرى المنطقة  
لمتضرري الفيضانات والزلازل





## تركيب الأبواب الحديدية للبيوت

Pakistan

15

التقرير السنوي للبيوت الخيرية السكنية  
لمتصري الغيصات والإرارات





## أعمال التشطيب في البيوت

Pakistan

16

التقرير السنوي الثالث لمنتدى التنمية  
لمنطري الفيضانات والزلازل





منظر عام مرتفع للقريّة



Pakistan

17

التحديين الحرجين الثالثين: التعرّيب  
لمتضرري الفيضانات والزلازل





# القرية الثانية مظفر كره - البنجاب



18

التقرير السنوي للبلديات المحلية، المقننة  
امتصري الفيشانات والزلازل



## الوضع الحالي لقرية البنجاب - مظفر كره - تحت إشراف مؤسسة IHH - يمثلها مؤسسة خيب

1. تقع القرية النموذجية في إقليم البنجاب مظفر كره - باكستان

- المساحة الإجمالية للقرية 50,000 م<sup>2</sup>.
- القرية مكونة من عشر وحدات كل وحدة 20 بيتاً .
- تاريخ البدء بالمشروع 1 نوفمبر / 2014 م .
- مساحة الست 80 متراً

2. يتكون البيت من :

- غرفتين + حمام + مطبخ .
- غرفة رقم ( 1 ) مساحتها : 16 م = 4 م × 4 م
- غرفة رقم ( 2 ) مساحتها : 12 م = 3 م × 4 م
- مساحة المطبخ 5.5 م .
- مساحة الحمام 2.5 م .
- مساحة الصالة 8.5 م .



جدول يوضح نسبة إنجاز كل بلوك من بلوكات القرية على حدة

البيان	درجة الإنتهاء	عدد المنازل	الوصف	الرقم
إتمام الأسقف	% 60	8	Block-A	1
إتمام طبقة مقاومة الرطوبة	% 20	12	Block-B	2
إتمام الأسقف	% 60	10	Block-C	3
إتمام الأسقف	% 60	10	Block-C	
إتمام طبقة مقاومة الرطوبة	% 20	20	Block-D	4
إتمام الأسقف	% 60	20	Block-E	5
إتمام طبقة مقاومة الرطوبة	% 20	20	Block-F	6
تم بالكامل	% 100	5	Block-G	7
إتمام الأسقف	% 60	15	Block-G	
تم بالكامل	% 100	5	Block-H	
إتمام الأسقف والقضارة (الجصي)	% 72	5	Block-H	8
إتمام الأسقف	% 60	10	Block-H	
في طور إتمام الأعمال بالحديد	% 50	10	Block-J	9
إتمام الأسقف	% 60	10	Block-J	
إتمام طبقة مقاومة الرطوبة	% 20	20	Block-K	10
إتمام طبقة مقاومة الرطوبة	% 20	20	Block-L	11
200			مجموع المنازل	

تم الانتهاء من بناء 61% من مشروع بناء مدينة علي بور - مظفر كره.

Pakistan

20

التقرير الدوري الثالث لمرور التنمية  
لمتصري الفيضانات والزلزل

August 12, 2016

**Technical Report of IICO Model Village Ali Pur- Muzaffargarh**

It is certified that all the works of IICO Model Village Ali Pur are being executed as per working drawings and material is being used as per specification. The work is regularly supervised and laxity of any nature is not accepted at all cost. The update progress of work is as under:-

Sr. No	Description	Quantity of Houses	Status	Remarks
1	Block-A	8	60%	Linter Complete
2	Block-B	12	20%	DPC Completed
3	Block-C	10	60%	Linter Complete
	Block-C	10	60%	Linter Complete
4	Block-D	20	20%	DPC Completed
5	Block-E	20	60%	Linter Complete
6	Block-F	20	20%	DPC Completed
7	Block-G	5	100%	Completed
	Block-G	15	60%	Linter Complete
8	Block-H	5	100%	Completed
	Block-H	5	72%	Linter / Plaster Complete
	Block-H	10	60%	Linter Complete
9	Block-J	10	50%	Shuttering and steel work in progress.
	Block-J	10	60%	Linter Complete
10	Block-K	20	20%	DPC Completed
11	Block-L	20	20%	DPC Completed
<b>TOTAL HOUSES:</b>		<b>200</b>		

Overall work progress of IICO Model Village Ali Pur- Muzaffargarh is about 61%.

  
Abdul Haseeb  
Vice Chairman  
Khubaib Foundation

**KHUBAIB FOUNDATION**

To Serve The Humanity In Need At Large

Office # 112, Street # 8, Sector I-10/3, Islamabad - Pakistan  
Tel: +92 51 444 0837-8, Fax: +92 51 444 0836, Website: www.khubaibpakistan.org



Pakistan

21

التقرير الفوري الثالث الفرض السكنية  
لمتكمري الفيضانات والزلازل



## تجهيز الأساسات الخرسانية للبيوت



22

التقرير الدوري الثالث لعموم المنطقة  
لمتصري الفيضانات والزلازل



## مراحل البناء للبيوت داخل القرية



Pakistan

23

التعويض المادي الثالث للقرى المتضررة  
لمتضرري الفيضانات والزلازل





البيوت بعد تجهيزها للمتضررين

Pakistan

24

التقرير السنوي الثالث لمنتدى السكنية  
للمتضرري الفيضانات والزلازل



جانب من تجهيزات البيوت



25

التحرير البرقي الثالث للقرن العشرين  
لمنصري الفضائل والزلال





## تركيب الأرضيات والأبواب

Pakistan

26

التقرير السنوي الثالث للفترة السنوية  
لمتصري الفيضانات والزلازل



جانب من بيوت القرية المعدة للسكن



Pakistan

27

التقرير الدوري للأمم المتحدة  
لمتصري الفيضانات والزلازل





عدة بيوت تم تشييدها في القرية






الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية  
International Islamic Charity Organization



هيئة حكومية مستقلة

# شكر وتقدير

جزيل الشكر والتقدير إلى بيت الزكاة  
على دعمه المستمر لمشاريع وبرامج الهيئة الخيرية التنموية  
التي تخفف من معاناة أصحاب الحاجات والفقراء والمساكين  
في مختلف أنحاء العالم.

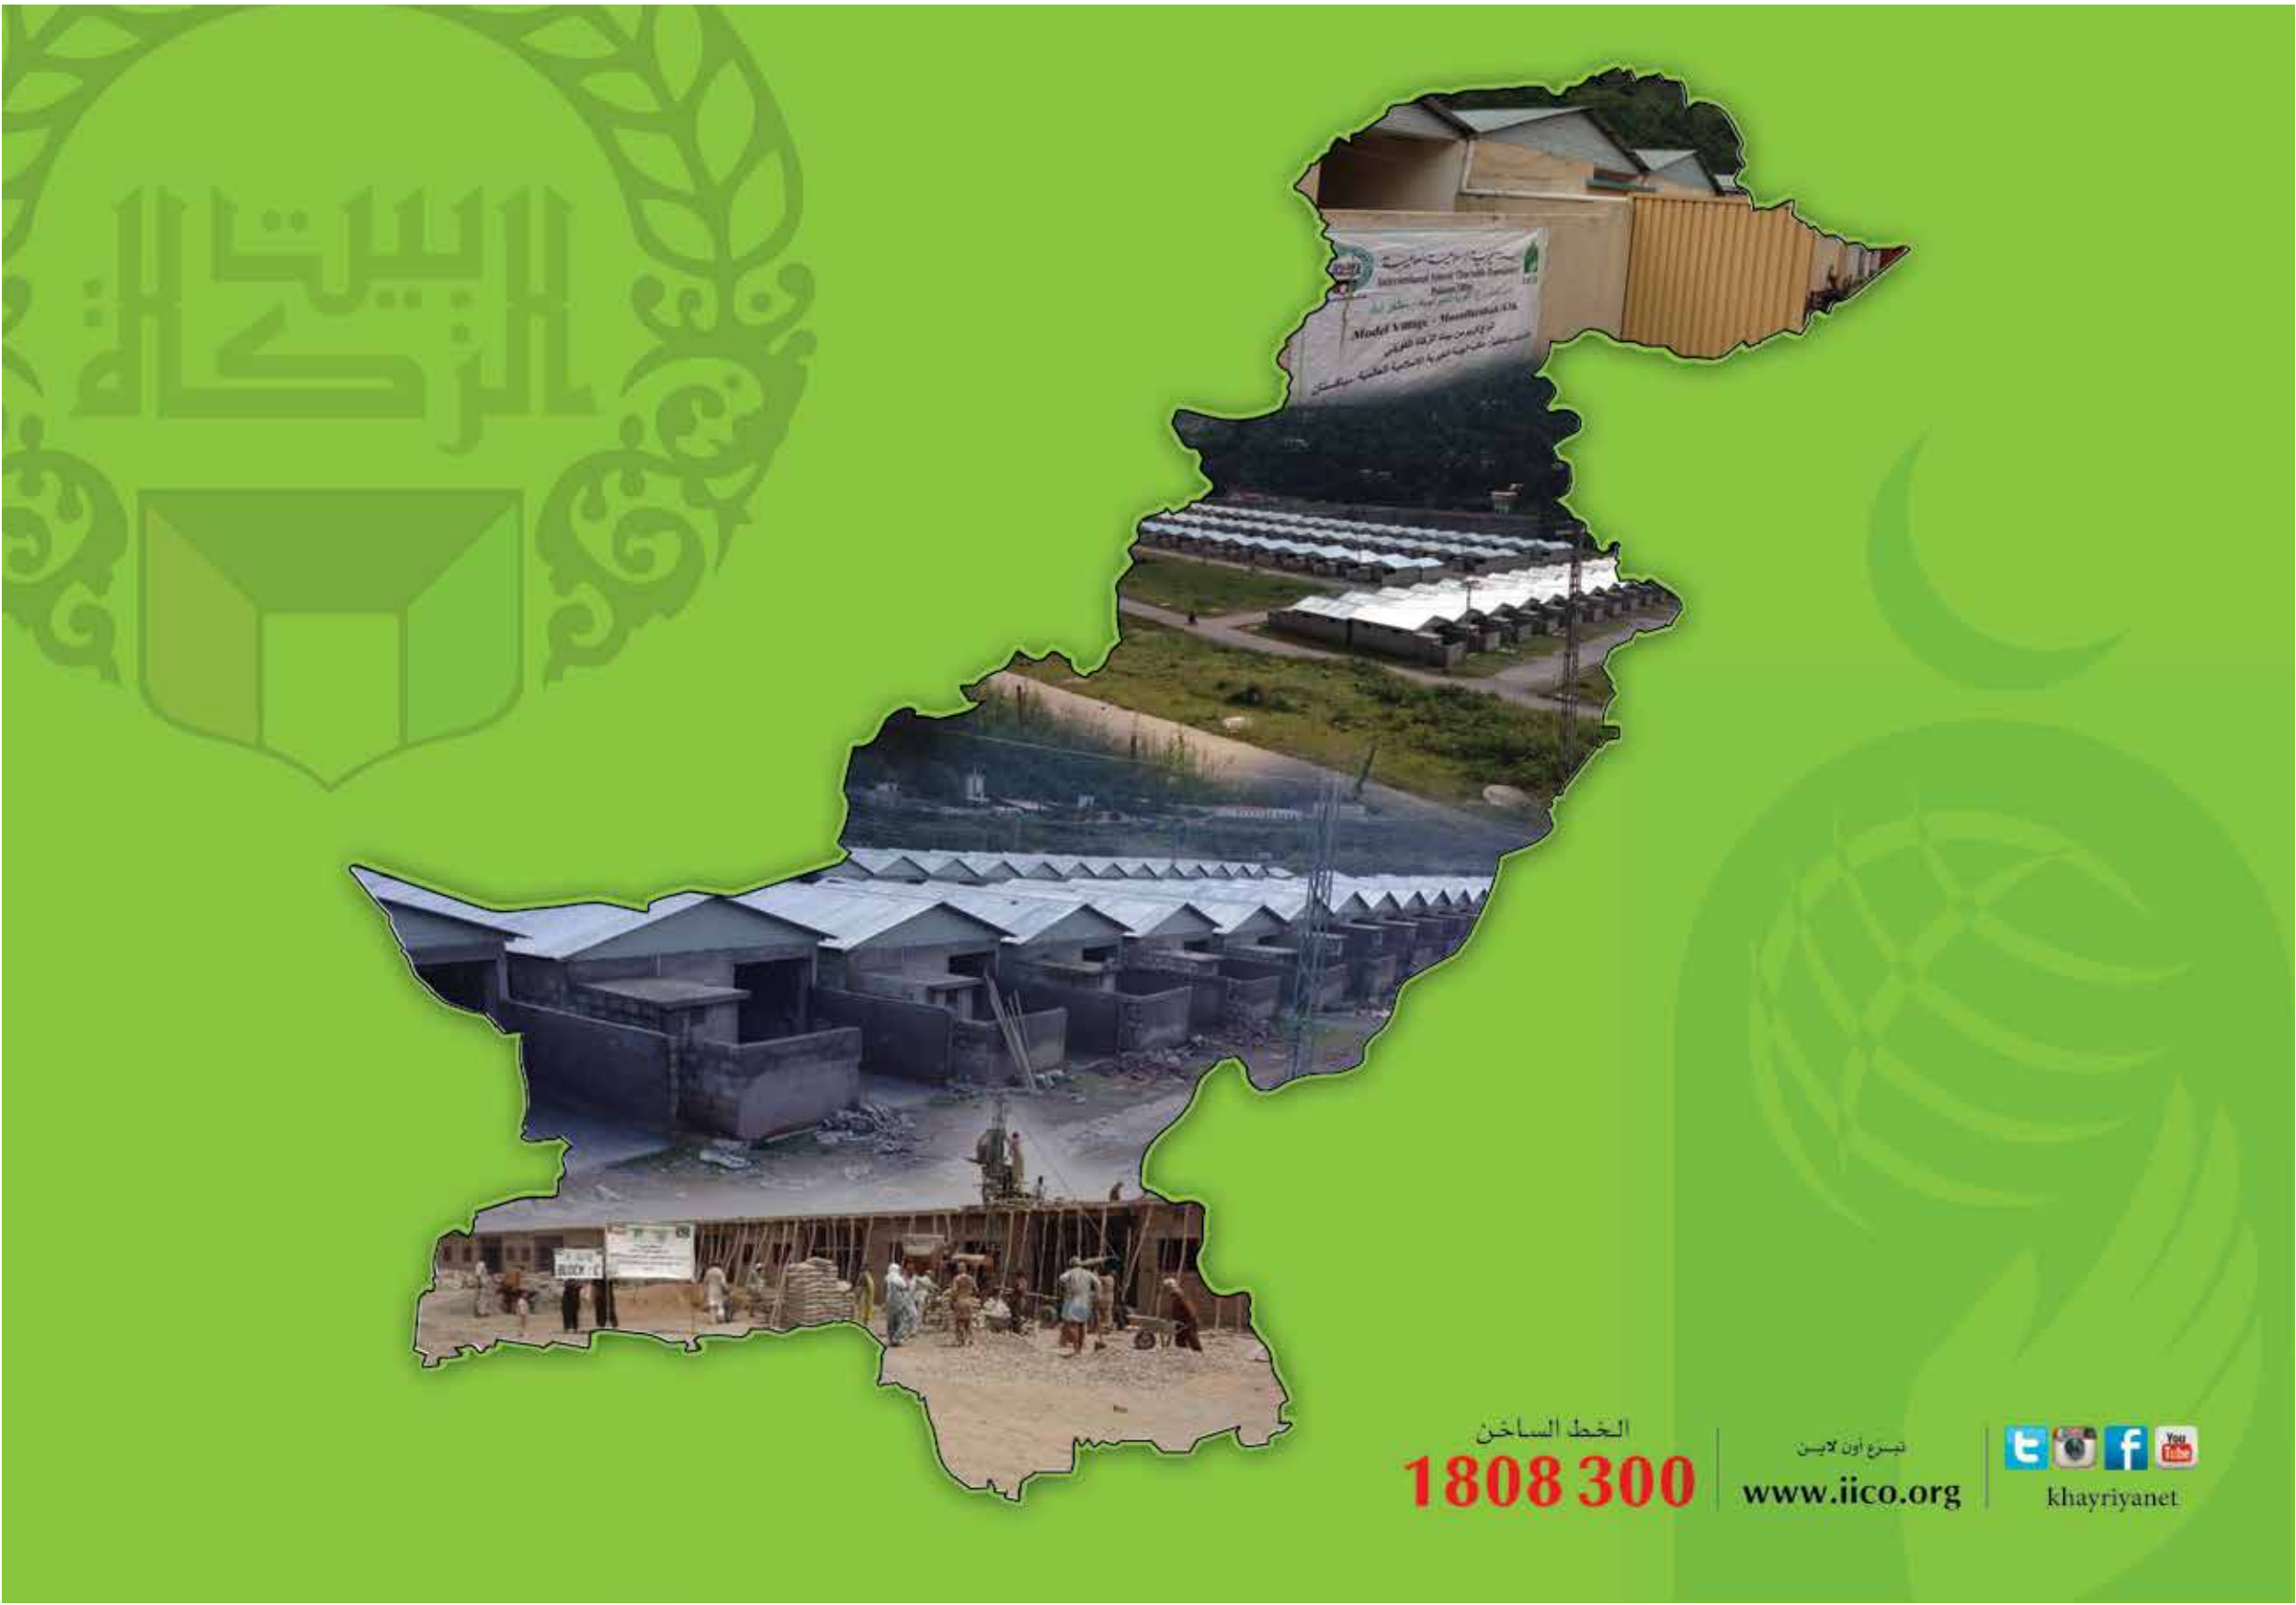

البيت  
الزكاة

الخط الساخن  
**1808 300**

تبرع أون لاين  
[www.iico.org](http://www.iico.org)







الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية  
International Islamic Charity Organization



هيئة حكومية مستقلة

التقرير الدوري الثالث للقرى السكنية

# لمتصري الفيضانات والزلازل

في

باكستان

أكتوبر  
2016
